スケジュール表（v3・案）

2026年10月 〜 2027年2月
進め方

10〜12月開発 → 12月末テスト準備完了 → 1月並行テスト → 2月検収。
計画であり契約ではない。


株式会社国宝社　木村 秀継 様

tugilo 次廣 淳　｜　2026年10月11日

助成金（板橋区 デジタル化・データ利活用推進助成金 業務管理システムコース。採択未確定）の採択・契約の時期で前後する。

1. 全体

2026-10-12 ～ 2027-02-28

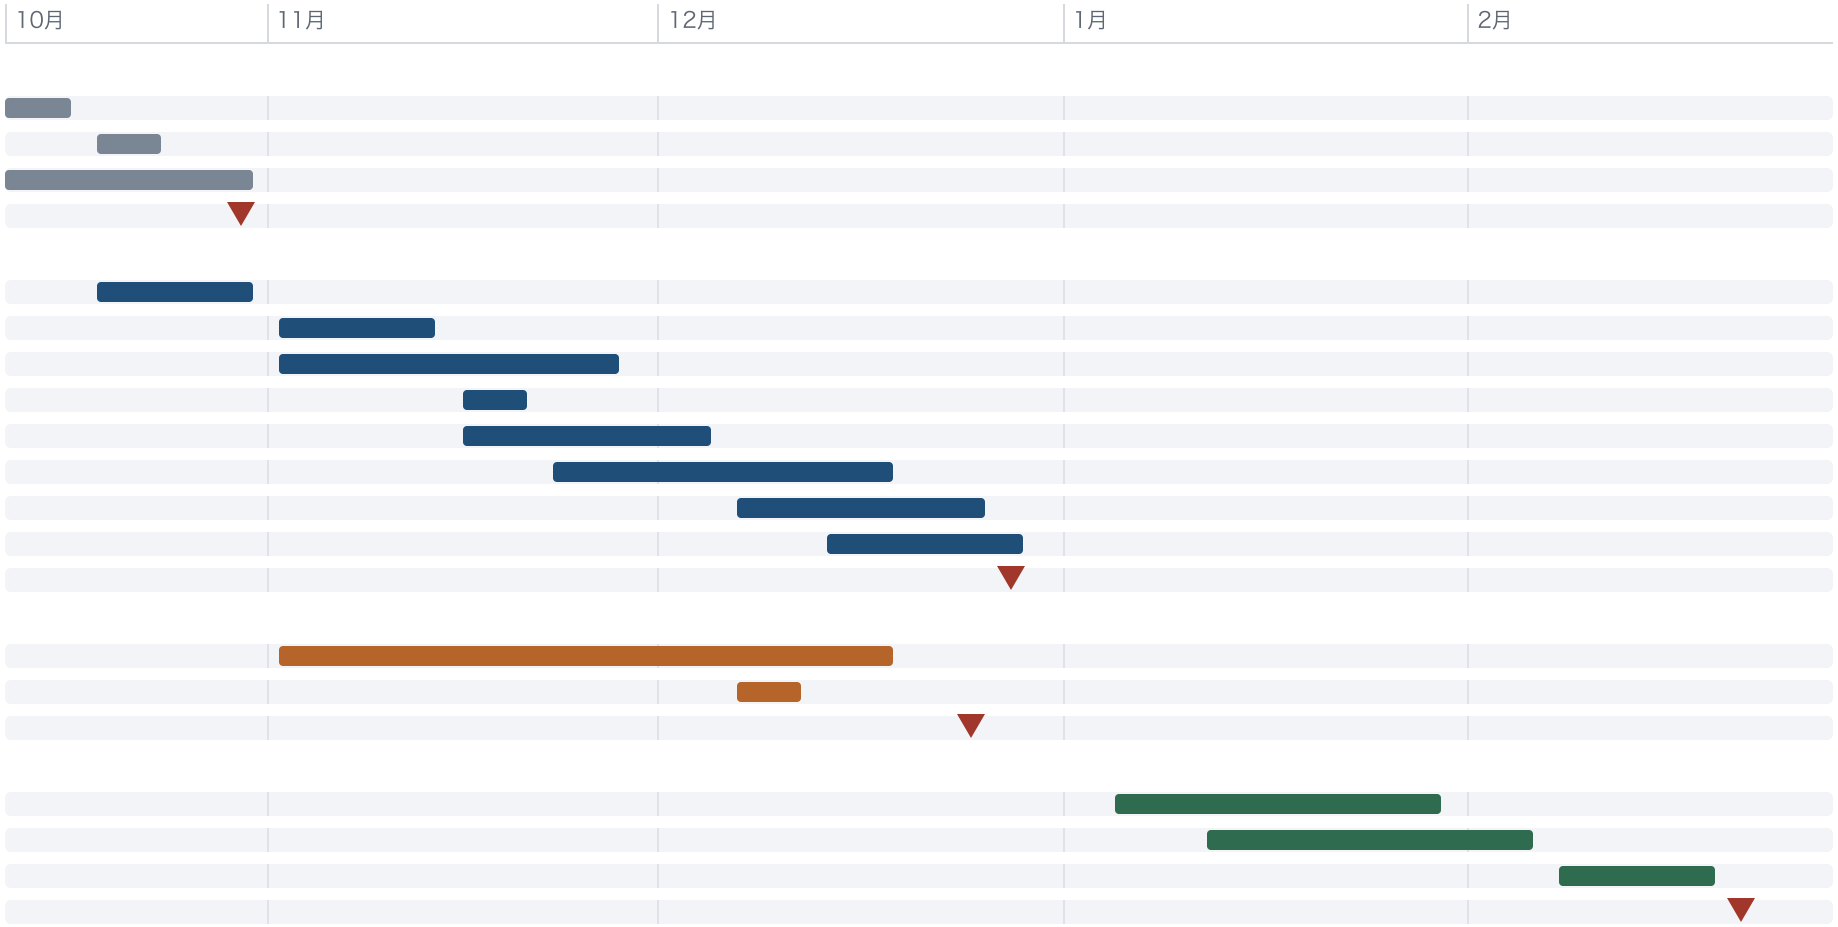

青＝tugilo／橙＝開発会社／緑＝並行テスト・検収／灰＝準備／◆＝マイルストーン

2．10月

文書提出 → 担当者 Zoom → 要件定義 → CSV レイアウト受領

週	tugilo	国宝社様	開発会社	成果・確認
10/12(月)〜	提案書 v3・見積・構成図・基本設計・仕様・本表を提出。質問を受ける	内容確認。助成金の必要書類の粒度を役所に確認	—	文書一式
10/19〜	**担当者 Zoom**(予定組み・事務)。自動配置の条件、稼働枠、優先度、主要1社の PDF を聞く。M0 着手	Zoom 参加。予定表 Excel 実ファイル・PDF サンプル追加	CSV レイアウト設計	ヒアリング記録
10/26〜	M0: 基本設計・仕様の確定版。置き場所(案A／B)を決める	契約手続き。既定フォルダの場所決め	**CSV レイアウト提示(10/30 目標)**	確定版 設計書・レイアウト

契約手続きは10月中の目標。開発着手を 11/2 に置き、10月後半は M0(要件定義)だけ先行する。採択が遅れる場合、11/2 以降が同じ日数だけ後ろへ。

3．11月

基盤・サーバー → 注文入力 → 手動入力 → CSV 出力

週	tugilo	国宝社様	開発会社	成果・確認
11/2(月)～	M1 共通基盤。S サーバー構築着手。M2 PDF 解析着手	サーバー(Hyper-V または専用PC)の用意	取込プログラム 設計	開発環境・ログイン
11/9～	M1・S 完了。M2 解析・項目欄	Oracle 読み取りアカウント(使う場合)	取込プログラム 開発	社内 URL で画面が開く
11/16～	M2 承認・次へ。M3 手動入力。M4 CSV 出力着手	得意先の照合方法を開発会社と確認	取込プログラム 開発	PDF 1件が承認まで通る
11/23～	M2 完了。M4 継続。M5 予定表着手	通知方法・UPDATE／DELETE を開発会社と確認	取込プログラム 開発	承認 → CSV ファイルが出る
11/30～	M4 完了(結果ファイル対応は方式確定後)。M5 予定表	—	取込プログラム 開発	CSV を開発会社に送る

4．12月

予定表 → 自動配置 → 結合テスト → テスト準備完了

週	tugilo	国宝社様	開発会社	成果・確認
12/7(月)～	M5 予定表(差し込み・作業時間・合計)。M6 自動配置着手。**結合テスト①**	結合テスト立会	**結合テスト①**(CSV → Oracle)	1件が Oracle に入る
12/14～	M5 完了。M6 ルール実装。M7 結合テスト	予定表の試し触り	修正	予定表で週が組める
12/21～	M6 完了。M7 テスト・操作メモ	並行テストの体制(誰が・いつ比べるか)	**取込口 完成(12/25 目標)**	自動配置ボタンが提案を出す
12/28(月)	**テスト準備完了**	**年末**	**年末**	**テスト環境・操作メモ**

5．1月〜2月

並行テスト → 実測 → 検収 → 運用開始 → 完了報告

週	tugilo	国宝社様	開発会社	成果・確認
1/5(火)〜	**並行テスト開始。**週1回の見直し(火曜 1h・Zoom)	現行の手入力・手組みと **並走。**PDF を Web にも通す。予定表を Web でも組む	取込を実運用手順で実行	差分一覧
1/12〜	並行テスト。解析の直し、ルールの重み調整	並走。差の理由を拾う	取込結果の確認	週次 差分
1/18〜	並行テスト。修正	並走	—	週次 差分
1/25〜	並行テスト 締め。時間の実測(手入力・予定組み)	並走。実測に協力	—	**実測値**(ROI 置き換え)
2/1〜	修正の最終。検収項目表	検収項目の確認	—	検収項目表
2/8〜	**検収。**引き渡し手順・バックアップ手順	検収	取込口の引き渡し	検収書
2/15〜	検収 修正。運用開始準備	運用体制	—	—
2/22(月)	**運用開始。立会**	**運用開始**	**—**	**—**
2/26(金)	—	**助成金 完了報告(期限 2/28)**	—	完了報告

6. マイルストーン

日付と条件

日	内容	条件
10/16(金)	文書一式 提出	—
10/23(金)	担当者 Zoom 完了	日程調整
10/30(金)	CSV レイアウト受領、契約手続き、置き場所決定	開発会社・助成金
12/11(金)	結合テスト①(CSV → Oracle 1件)	開発会社の取込口 試作
12/25(金)	取込口 完成	開発会社
12/28(月)	**テスト準備完了**	**tugilo**
1/5(火)	並行テスト開始	体制
1/29(金)	並行テスト 締め・実測	—
2/19(金)	**検収**	**—**
2/22(月)	運用開始	—
2/28(日)	助成金 完了期限	国宝社様

ずれたらどうするか

前提	遅れると
10/30 までに CSV レイアウト受領	M4 の確定が遅れる。tugilo は「たたき台」で先に作り、提示後に合わせる
10月中に契約手続き（採択の確約ではない）	11/2 着手がずれ、同じ日数だけ後ろへ。2/28 を越える場合は範囲（あれば便利）で調整
11月中にサーバー（Hyper-V の空き or 専用PC）	M1・S が後ろへ。開発はローカルで進め、配置だけ後ろにできる
12/25 に取込口完成	1月に Oracle まで通せない。CSV まで並走し、取込だけ後追い
1月に並走の体制（事務・予定組み担当）	実測が取れない。検収は機能ベースで行い、実測は運用開始後
予定表 Excel 実ファイル・PDF サンプル追加（10月）	解析・予定表のカード項目の確定が遅れる

会議体

木村さん 1to1（Zoom）	2週に1回・40分
担当者ヒアリング	10月に1回
開発会社 連携確認	10月末・11月中・12月結合時
並行テスト見直し	1月 週1回・1時間
