ご提案（改訂版 v3）

注文PDF入力・製本作業予定表システム

基幹（VB+Oracle）は守り、入口と予定表だけを軽くする。
第4回打合せ（2026年10月5日）の合意を反映。

株式会社国宝社　木村 秀継 様
tugilo 次廣 淳　｜　2026年10月11日
契約書・正式見積書ではありません。金額は別紙「機能別見積」（税別・案）。

1．結論

作る Web は1つ。人が使う機能は2つ。基幹には手を入れない

機能1　注文入力

注文書PDF をまとめて上げる → 項目ごとの欄に抜き出す → **人が1件ずつ直して承認** → **CSV に出す** → 既存システム側の取込プログラムが Oracle に入れる。

機能2　製本作業予定表

いま Excel を印刷してペンで組んでいる週次の予定表を、同じ並びの画面に。手で置く操作に加えて **自動配置ボタン**（ルールで組む。人が確定）。

第4回で変わった点（3つ）

① Oracle へ直接書き込まない

こちらの DB に仮登録 → CSV 出力 → 既存システムの取込プログラムで Oracle へ。取込プログラムは開発会社が作る（2026-09-29 資料）。

② 自動配置を入れる

AI ではなくルール（納期・作業時間・優先度・場所の空き）で順番を提案し、人が確定する。

③ Excel 生産依頼表は手入力から

メール添付の生産依頼表は、まず手で入力する画面。自動取り込みは段階的に。

2．いま詰まっているところ

入口だけ直しても、予定表で紙に戻る

場所	いま	時間（木村さん申告）
入口	出版社の PDF 注文書を見ながら、事務が VB に手入力。大口だけで月300〜400件	**1.5** 時間/日
生産依頼表	発注者から Excel テンプレートがメール添付で届く。これも手で転記	—
予定表	Excel を一度印刷し、ペンで差し込み・入れ替え・工数を書く。紙だけが最新になる	**2** 時間/日

今回の範囲は、入口と予定表をつなぐこと。どちらか片方では、転記と紙が残る。

PDF → 人が確認 → 承認 → CSV。Oracle へは取込プログラムが入れる

① まとめて上げる
注文書PDF をドラッグ&ドロップ。原本を保存

→

② 解析
1件ずつ、項目ごとの欄に抜き出す。信頼度を色で

→

③ 人が直す
必ず人が見る。得意先・部数・判型・日付

→

④ 承認
こちらの DB に仮番号で登録。「次へ」で次の PDF

→

⑤ CSV 出力
承認済みを既定フォルダへ。ファイル名は一意

→

⑥ 取込（既存側）
開発会社の取込プログラムが Oracle へ。手動実行

対象

- 最初は **型の揃った主要1社** の PDF。他社フォーマットは後から足す
- メール添付の生産依頼表 Excel は **手動入力画面** で同じ DB へ → 同じ CSV へ

やらないこと

- 100%自動登録。人が1件ずつ承認する
- Oracle への直接書き込み。Oracle にテーブルも足さない
- 手書き注文書の OCR

4．機能2　製本作業予定表

紙と同じ並びの画面。手で置く＋自動配置ボタン

	板橋1F	1F予備	2F	2F予備	ふじみ野	ふじみ野予備
10/19(月)	明祭パンフ 19,000 <3.0h> ○○文庫 5,000 <1.5h>		△△新書 8,000 <2.0h>	□□A5 3,000 <0h>	××B6 12,000 <4.0h>	
10/20(火)	○○文庫 続 <2.5h>	手追加：見本のみ	◇◇B5 6,000 <0h>			

橙＝作業時間 未入力／緑＝入力済み／灰＝手追加／斜線＝塞ぎ。左に「未配置」、マス・日・週の合計を表示。

できること

- 未配置からマスへドラッグ。先頭・間・末尾の差し込み
- カードに作業時間。合計を自動で
- 印刷に無い注文の手追加、枠の塞ぎ、入れ替え

自動配置（ルール）


- 納期・作業時間・優先度・場所の空きで並べ直し、**提案**する
- 人が **確定** を押すまで反映しない。手直しは記録してルールの見直しに使う
- 1月の並行テストで現行の手組みと比べ、合うまで直す

作らない（第4回決定）

予定表の CSV 出力・印刷機能／順番の自動確定／AI による配置（API 拡張は将来の選択肢）

5. つながりと置き場所

補助DB は正にしない。受注の正は Oracle のまま

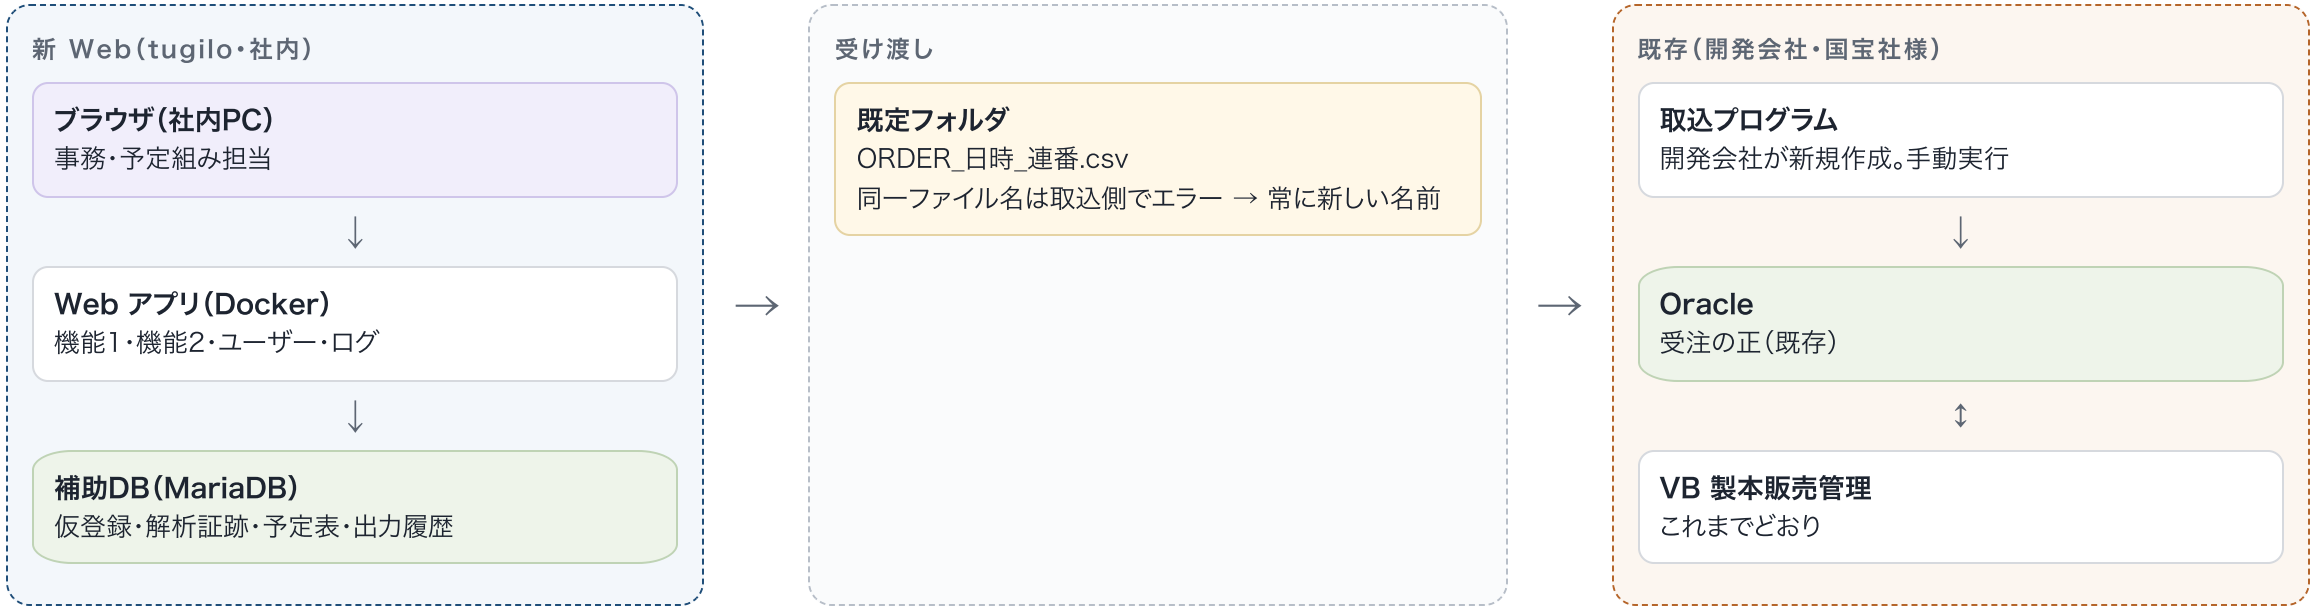

置き場所は社内

既存 Windows の Hyper-V 上 Ubuntu（案A）、または専用PC 16GB・SSD（案B）。外には出さない。Google Workspace／GAS は使わない。

Oracle は読むだけ（要確認）

得意先の参照と、VB で直接入力された注文を予定表に出すため、読み取り専用で参照したい。難しければ開発会社から一覧 CSV を受ける案。

6. 既存システム開発会社との分担

2026-09-29 の打合せ資料の範囲分けに合わせる

範囲	担当
注文書PDF → 注文データ CSV、補助DB、注文情報修正画面、予定表	tugilo
CSV の連携レイアウト設計・提示	開発会社
CSV → 製本管理システム DB への取込プログラム	開発会社
取込の実行（既定フォルダに置いて起動。手動・任意のタイミング）	国宝社様

開発会社の資料にある確認事項

- 取込結果の通知方法
- 既存データの UPDATE／DELETE の有無

tugilo の案（基本設計書 §6）

- 結果ファイル（同名＋_result.csv）を既定フォルダに置いてもらい、Web が読んで状態を更新
- 初回は **INSERT のみ**。承認後の修正・取消は VB 側で行う運用

境界は「既定フォルダの CSV」。ここが決まれば両側は独立に進められる。

7. 進め方

10〜12月開発 → 1月並行テスト → 2月検収（計画。契約ではない）

10月
予定組みご担当者を交えたZoom（自動配置の条件）。契約手続き。CSV レイアウト受領

→

10〜12月
開発。機能1 → CSV → 機能2 → 自動配置の順

→

12月末
テスト準備完了。開発会社側の取込口も完成

→

1月
並行テスト。現行の手組み・手入力と並べて比べる

→

2月
検収・運用開始

助成金について

板橋区「令和8年度 デジタル化・データ利活用推進助成金」業務管理システムコース（上限200〜300万円と伺っている・完了 2027-02-28 の計画）は木村さん側で手続き中。採択は未確定。**採択前に契約・発注した扱いにはしません。**必要書類（仕様書・設計書の粒度）は、役所確認後にこちらで合わせます。

週単位は別紙「スケジュール表」。

8. 費用の考え方と判断の目安

必須だけで2機能が動く。回収は試算であって保証ではない

費用の分け方

- 機能ごとに 必須 と あれば便利 を分けた
- 必須だけで、注文入力・CSV・予定表・自動配置 v1 が動く
- サーバー構築は別枠。保守は月額の目安
- 金額・内訳は別紙「機能別見積」（税別・案）

ROI の目安（木村さん申告の時間から試算）

手入力 1.5時間 ＋ 予定組み 2時間 ＝ **1日3.5時間**。月20日で 70時間/月、**840時間/年**。

削減率	年間削減時間	年間効果（@¥2,500/h 仮）
50%	420時間	約105万円
70%	588時間	約147万円

単価は参考。実測は1月の並行テストで置き換える。

9．7月・8月からの差分

何が変わったかを一覧で

項目	7月（入口のみ）	8月改訂（23枚）	今回 v3
Oracle 連携	直接書き込み	直接書き込み	**CSV 出力 → 取込プログラム（開発会社）**
機能	入口1つ	入口＋予定表	入口＋予定表＋**自動配置（ルール）**
生産依頼表 Excel	—	「他帳票を転記」	**手動入力画面から。自動取込は段階的**
予定表の出力	—	印刷は従来どおり	**CSV 出力・印刷は作らない**
金額	50／180／230万＋箱	214／289／379万	**機能別・必須／あれば便利**（別紙）
日程	—	9月着手・1月試運用	**10〜12月開発・1月並行テスト・2月検収**

10. 確認したいこと

次に進むために

1. CSV レイアウト（開発会社設計）の受領時期
2. 取込結果の通知方法と、UPDATE／DELETE の扱い（開発会社との確認）
3. 最初に対象にする主要1社の社名と、PDF サンプルの追加
4. 予定表 Excel の実ファイル
5. 置き場所（既存 Hyper-V か専用PC か）
6. 自動配置のルール（10月 Zoom）
7. 助成金の必要書類の粒度

おわりに

目的は、システムを入れることではなく、詰まっている仕事を仕組みにすることです。

基幹は守り、入口と予定表だけを軽くします。

1月の並行テストで、紙より楽になっているか、一緒に確かめさせてください。

別紙: ② 機能別見積 ／ ③ システム構成図 ／ ④ 基本設計書 ／ ⑤ 仕様書 ／ ⑥ スケジュール表 ／ 画面見本 https://tugilo.com/mock/kokuhosha-pdf-order-schedule.html
